


平成20年度再評価

12. 路線名: 主要地方道 小城牛津線

事業名: 地方道路交付金事業

主要地方道 小城牛津線 位置図

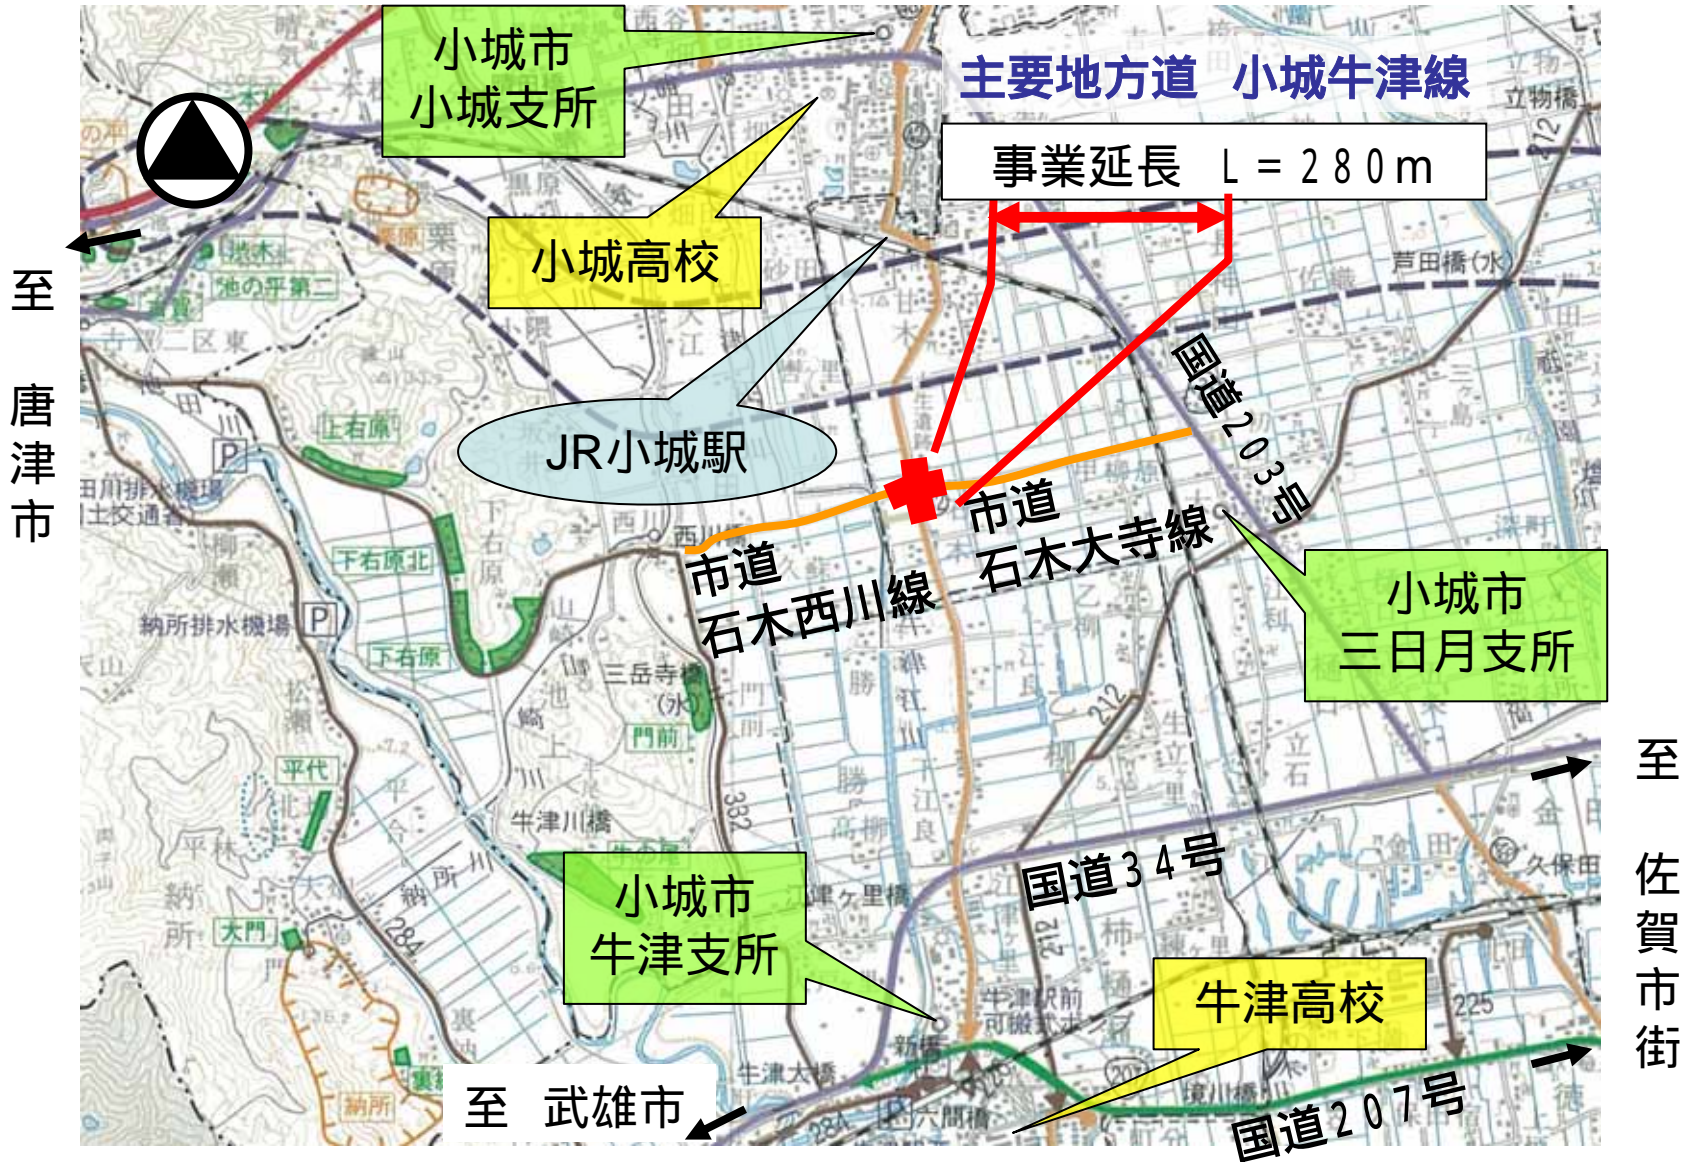

事業目的

小城市小城市町



小城市牛津町

通勤や通学の為
に重要な道路

小城高校や
牛津高校への
通学路

しかし、現道は…

交差点が狭い
歩道が無い

混雑
自転車歩行者が危険

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全を確保
安全・安心な道路空間を形成

現道状況

幅員狭小、通学者危険状況



未整備箇所は、通学者が危険にさらされている。



混雑状況



バス停未整備箇所





石木バス停

事業概要

- 全体事業費：3.6億円
- 工期：平成11年度～平成22年度(予定)
- 全体延長：L = 280m
- 事業内容：改良工 L = 280m
 - 用地買収 2,048m²
 - 家屋補償 12戸

主要地方道 小城牛津線 平面図

全体延長 L=240m

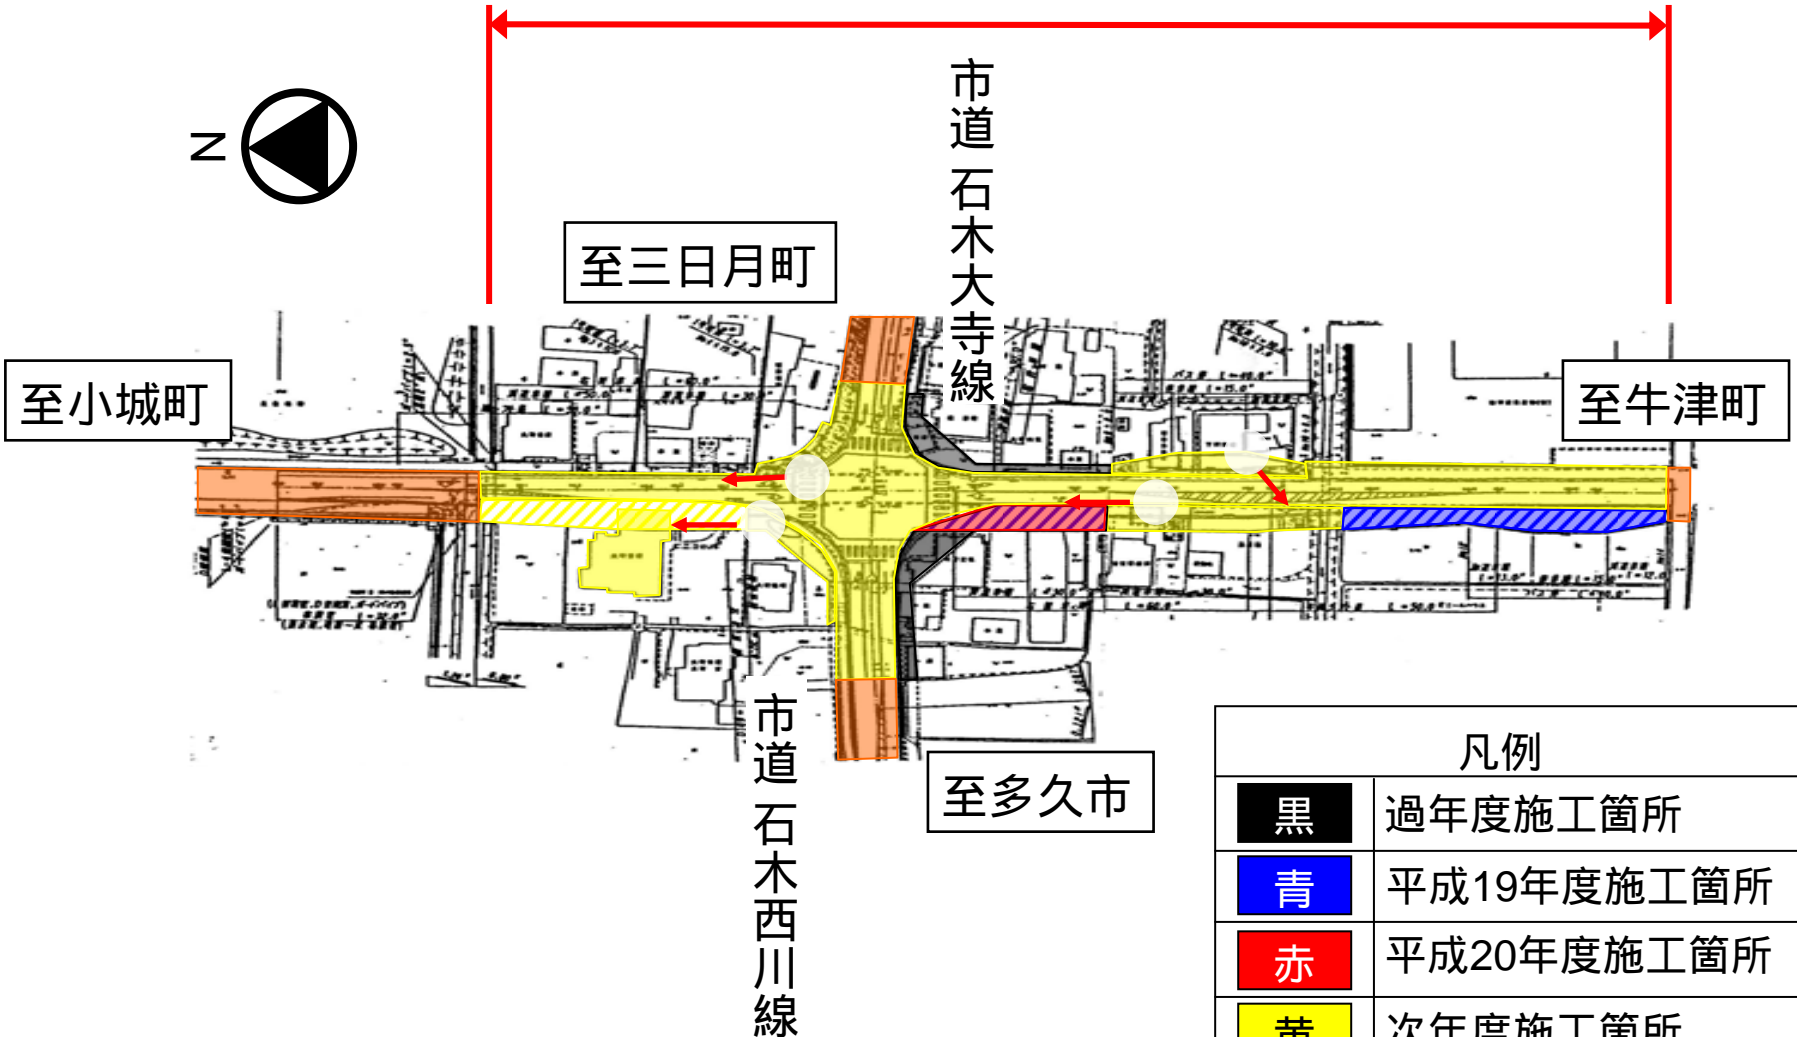

凡例	
黒	過年度施工箇所
青	平成19年度施工箇所
赤	平成20年度施工箇所
黄	次年度施工箇所

事業の進捗状況

	平成19 年度まで	平成20 年度	平成21 年度以降
事業費(億円)	1.3	0.6	1.7
進捗率(%)	35.6	50.8	100.0
用地進捗率 (%)	39.3	66.8	100.0

- 用地買収は、2,048㎡のうち、723㎡が契約済みである。
- 家屋補償は、12戸のうち、7戸が契約済みである。
- 工事は、交差点隅切部を一部暫定舗装している。



事業の効果

- 交通安全事業(交差点改良)であるため
B / Cは算出しない。

今後の対応

- 本路線は、交通量が増加傾向にあり、更なる交通量の増加が見込まれる。
- 当該箇所については、依然として危険な状況が解消されていないため、事業を継続し、交通安全の確保及び円滑な交通の確保を図る。
